

PROTOCOLO DE CONTROL DE CAPAS

Av. Los Álamos — Pavimentación

Cliente: Municipalidad Distrital de San Borja · Ubicación: San Borja, Lima
Consortio Vial Los Álamos

TOPO APP

Fecha de emisión
04/10/2026

Datos del control Calzada — Pavimento flexible

Tramo	0+000.00 a 0+160.00	Puntos de control	27
Progresiva inicial	0+000.00	Cota inicial rasante	152.150 m
Pendiente long.	+1.20 %	Bombeo	2.00 % (dos aguas)
BM de referencia	BM-1 (152.315 m)	Instrumento	Nivel automático Sokkia B40 · Estación ...

Paquete estructural capas de arriba hacia abajo

N°	Capa	Espesor (m)	Prof. bajo rasante (m)	Tolerancia (±mm)	Medidos	% conforme	Estado
1	Carpeta asfáltica	0.050	0.000	6	0 / 27	—	PENDIENTE
2	Base granular	0.200	0.050	10	18 / 27	88.9 %	AL LÍMITE
3	Sub-base granular	0.200	0.250	20	0 / 27	—	PENDIENTE
4	Subrasante	0.000	0.450	20	27 / 27	85.2 %	AL LÍMITE

Capa: Base granular Tolerancia ±10 mm · espesor 0.200 m · 18/27 puntos medidos

Progresiva	Ubicación	Desplaz. (m)	Cota diseño	Cota medida	Dif. (mm)	Estado
0+000.00	Izq	-3.60	152.028	152.038	+10.0	CONFORME
0+000.00	Eje	0.00	152.100	152.111	+11.0	AL LÍMITE
0+000.00	Der	+3.60	152.028	152.035	+7.0	CONFORME
0+020.00	Izq	-3.60	152.268	152.274	+6.0	CONFORME
0+020.00	Eje	0.00	152.340	152.348	+8.0	CONFORME
0+020.00	Der	+3.60	152.268	152.263	-5.0	CONFORME
0+040.00	Izq	-3.60	152.508	152.503	-5.0	CONFORME
0+040.00	Eje	0.00	152.580	152.582	+2.0	CONFORME
0+040.00	Der	+3.60	152.508	152.498	-10.0	CONFORME
0+060.00	Izq	-3.60	152.748	152.747	-1.0	CONFORME
0+060.00	Eje	0.00	152.820	152.825	+5.0	CONFORME
0+060.00	Der	+3.60	152.748	152.747	-1.0	CONFORME
0+080.00	Izq	-3.60	152.988	152.979	-9.0	CONFORME
0+080.00	Eje	0.00	153.060	153.055	-5.0	CONFORME
0+080.00	Der	+3.60	152.988	152.982	-6.0	CONFORME
0+100.00	Izq	-3.60	153.228	153.233	+5.0	CONFORME
0+100.00	Eje	0.00	153.300	153.288	-12.0	AL LÍMITE
0+100.00	Der	+3.60	153.228	153.236	+8.0	CONFORME
0+120.00	Izq	-3.60	153.468			PENDIENTE
0+120.00	Eje	0.00	153.540			PENDIENTE
0+120.00	Der	+3.60	153.468			PENDIENTE
0+140.00	Izq	-3.60	153.708			PENDIENTE
0+140.00	Eje	0.00	153.780			PENDIENTE
0+140.00	Der	+3.60	153.708			PENDIENTE
0+160.00	Izq	-3.60	153.948			PENDIENTE
0+160.00	Eje	0.00	154.020			PENDIENTE
0+160.00	Der	+3.60	153.948			PENDIENTE

PROTOCOLO DE CONTROL DE CAPAS

Av. Los Álamos — Pavimentación


Cliente: Municipalidad Distrital de San Borja · Ubicación: San Borja, Lima
Consorcio Vial Los Álamos

TOPO APP

Fecha de emisión
04/10/2026

Resumen estadístico	Valor
Puntos de control / medidos	27 / 18
Conformes	16
Al límite (hasta 1.5·T)	2
No conformes	0
Pendientes	9
Desviación máx. alta (+)	+11.0 mm
Desviación máx. baja (-)	-12.0 mm
Media / desv. estándar	+0.4 / 7.4 mm
% conforme	88.9 %
Estado de la capa	AL LÍMITE

Distribución de desviaciones (mm)

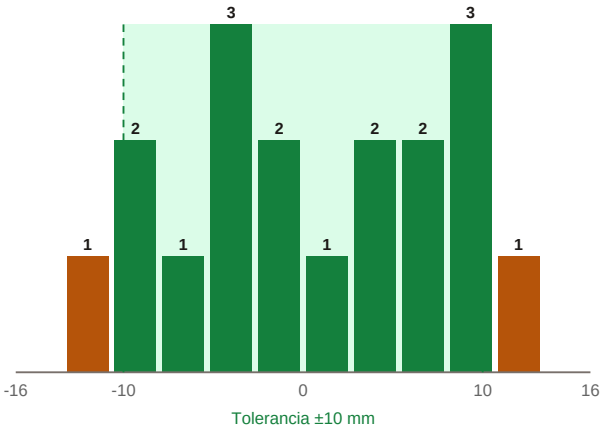

PROTOCOLO DE CONTROL DE CAPAS

Av. Los Álamos — Pavimentación

Cliente: Municipalidad Distrital de San Borja · Ubicación: San Borja, Lima
Consorcio Vial Los Álamos

TOPO APP


Fecha de emisión
04/10/2026

Capa: Subrasante Tolerancia ± 20 mm · espesor 0.000 m · 27/27 puntos medidos

Progresiva	Ubicación	Desplaz. (m)	Cota diseño	Cota medida	Dif. (mm)	Estado
0+000.00	Izq	-3.60	151.628	151.628	0.0	CONFORME
0+000.00	Eje	0.00	151.700	151.701	+1.0	CONFORME
0+000.00	Der	+3.60	151.628	151.622	-6.0	CONFORME
0+020.00	Izq	-3.60	151.868	151.889	+21.0	AL LÍMITE
0+020.00	Eje	0.00	151.940	151.945	+5.0	CONFORME
0+020.00	Der	+3.60	151.868	151.872	+4.0	CONFORME
0+040.00	Izq	-3.60	152.108	152.103	-5.0	CONFORME
0+040.00	Eje	0.00	152.180	152.180	0.0	CONFORME
0+040.00	Der	+3.60	152.108	152.118	+10.0	CONFORME
0+060.00	Izq	-3.60	152.348	152.350	+2.0	CONFORME
0+060.00	Eje	0.00	152.420	152.398	-22.0	AL LÍMITE
0+060.00	Der	+3.60	152.348	152.345	-3.0	CONFORME
0+080.00	Izq	-3.60	152.588	152.612	+24.0	AL LÍMITE
0+080.00	Eje	0.00	152.660	152.659	-1.0	CONFORME
0+080.00	Der	+3.60	152.588	152.586	-2.0	CONFORME
0+100.00	Izq	-3.60	152.828	152.824	-4.0	CONFORME
0+100.00	Eje	0.00	152.900	152.924	+24.0	AL LÍMITE
0+100.00	Der	+3.60	152.828	152.829	+1.0	CONFORME
0+120.00	Izq	-3.60	153.068	153.072	+4.0	CONFORME
0+120.00	Eje	0.00	153.140	153.138	-2.0	CONFORME
0+120.00	Der	+3.60	153.068	153.086	+18.0	CONFORME
0+140.00	Izq	-3.60	153.308	153.289	-19.0	CONFORME
0+140.00	Eje	0.00	153.380	153.374	-6.0	CONFORME
0+140.00	Der	+3.60	153.308	153.305	-3.0	CONFORME
0+160.00	Izq	-3.60	153.548	153.556	+8.0	CONFORME
0+160.00	Eje	0.00	153.620	153.612	-8.0	CONFORME
0+160.00	Der	+3.60	153.548	153.535	-13.0	CONFORME

Resumen estadístico	Valor
Puntos de control / medidos	27 / 27
Conformes	23
Al límite (hasta 1.5 · T)	4
No conformes	0
Pendientes	0
Desviación máx. alta (+)	+24.0 mm
Desviación máx. baja (-)	-22.0 mm
Media / desv. estándar	+1.0 / 11.3 mm
% conforme	85.2 %
Estado de la capa	AL LÍMITE

Distribución de desviaciones (mm)

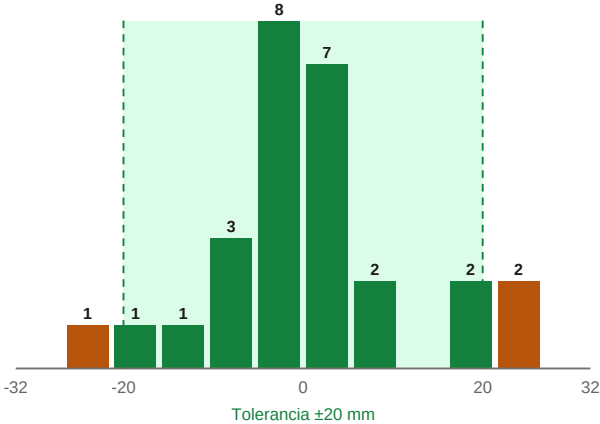

PROTOCOLO DE CONTROL DE CAPAS

Av. Los Álamos — Pavimentación

Cliente: Municipalidad Distrital de San Borja · Ubicación: San Borja, Lima

Consorcio Vial Los Álamos

TOPO APP

Fecha de emisión

04/10/2026

Criterio: Dif. = cota medida - cota de diseño (+ alto / cortar, - bajo / rellenar). CONFORME si $|Dif.| \leq T$; AL LÍMITE si $|Dif.| \leq 1.5 \cdot T$; NO CONFORME en otro caso. Tolerancias según especificaciones técnicas del proyecto (referencia MTC EG-2013).

Fecha de liberación de capa: ____ / ____ / ____

Topógrafo

Ing. Max Antony

CIP N° 000000

Ingeniero Residente

Nombre:

CIP N°:

Ingeniero Supervisor

Nombre:

CIP N°:
